

TERRITÓRIO 35


Maraponga, Manuel Sátiro, Jardim Cearense e Mondubim

A agenda do Território Maraponga, Manuel Sátiro, Jardim Cearense e Mondubim foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até o mês de Fevereiro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 39 ações acordadas, 5 já foram concluídas e 25 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 9 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	39
Concluídos	5
Em andamento	25
Sem informação	9

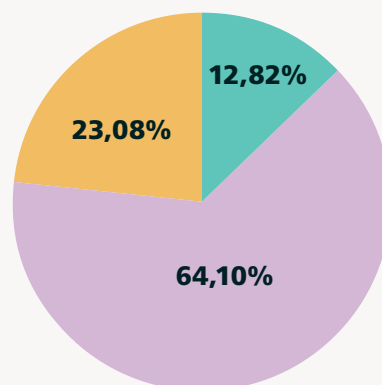

0

EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Construção de Torre de Segurança no Mondubim.	Mais Ação	Em obra – Previsão de término da obra 20/01/2020.
Unidade de Segurança Integrada 23 2ª Cia / 6º BPM.	GEC/Juntos por Fortaleza	Sem informação.

1

EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
72 ruas do território serão beneficiadas pelo Proinfra – implantação de infraestrutura de drenagem, pavimentação, esgotamento sanitário e urbanização	Seinf	Em obra. 30/08/2019 – Início da obra das ruas do Mondubim. 30/02/2022 – Previsão término da obra.
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP/ Seinf	Pesquisa concluída. Análise dos dados em andamento.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ciclovias existentes.	SCSP	Sem informação.
Binário Passaré/Maraponga.	SCSP	Em projeto. Previsão para final 2020.
Estações Bicicleta.	SCSP	Em implantação. Conclusão em maio/2020.
Binário Cônego de Castro / Dom Xisto Albano.	SCSP	Em projeto. A iniciar.

2

EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Urbanização da Lagoa da Maraponga.	Juntos por Fortaleza	Sem informação.
Lançamento do Programa Médico da Família. Existem concursos vigentes para profissionais da área (Edital 61 a 69 de 2015). Existem seleções públicas vigentes para profissionais da área (Editais 25, 26 e 27/2018).	SMS	Sem informação.
Está sendo concluída uma reterritorialização visando a um realinhamento do território para melhor atendimento.	SMS	Sem informação.
Os postos já estão adequados para o atendimento diário para todas as faixas etárias.	SMS	Os postos já estão adequados para o atendimento diário para todas as faixas etárias. Outra iniciativa foi a Adesão ao Programa Saúde na Hora (em 58 Postos de Saúde, com 210 equipes), com as UAPS funcionando até às 19h.
Reforma na UBS Luciano Torres de Melo.	SMS	Em obra. Previsão de conclusão junho 2020.
CAPS Infantil do Bom Jardim em processo de implantação.	SMS	Sem informação.
Reforma da Praça da Villa.	Mais Ação	Em obra. 03/09/2019 – Início da reforma da Praça da Villa. 06/12/2020 – Previsão término da obra.
Reforma da Praça MartModa.	Mais Ação	Em obra. 20/01/2020 – Início da obra. 20/03/2020 – Previsão término da obra.
Areninha do Campo do Alto da Paz.	Mais Ação	Em obra.
Areninha do Campo do São Paulo.	Mais Ação	Em obra. 27/06/2019 - Início da construção da Areninha do Campo do São Paulo. 25/01/2020 - Previsão término da obra.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Campinho Mondubim.	Mais Ação	12/09/2019– Entregue Mini Areninha do Mondubim.
Areninha do Campo do Sítio do Córrego.	Mais Ação	20/01/2020 – Previsão início da obra.
Mini-Areninha Mondubim.	Mais Ação	12/09/2019 – Entregue Mini Areninha do Mondubim.
Arraiá da Juventude.	Coordenadoria da Juventude	Sem informação.
Reforma UBS Pedro Celestino, Maraponga.	Mais Ação	Abril 2020 – Previsão início da obra. Prazo de entrega julho 2020.
Reforma UBS Luíza Távora, Mondubim.	Mais Ação	Março 2020 – Previsão início da obra. Prazo de entrega junho 2020.

3

EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Previsão de uma escola no Mondubim – ETI na Rua Renato Magalhães.	SME	ETI - Rua Renato Magalhães, Mondubim. Obra em execução.
Reforma da Escola Municipal Professor Jacinto Botelho - EI / EF.	Mais Ação	Em obra. 06/11/2018 - Início da reforma da Escola Municipal Professor Jacinto Botelho - EI / EF. 06/01/2020 - Previsão término da obra.
Reforma da Escola Maria Viviane Benevides Gouveia.	Mais Ação	Em projeto.
Reforma da Escola Professor Osmírio de Oliveira Barreto - EI / EF.	Mais Ação	Em projeto.
Reforma da Quadra da Escola Jacinto Botelho.	Mais Ação	Em obra a reforma da Escola Jacinto Botelho.
Reforma de Quadra da Escola Casimiro Montenegro.	Mais Ação	Em projeto reforma da Escola Casimiro Montenegro.
Reforma da Quadra da Escola Henriqueta Galeno.	Mais Ação	Sem informação.

4

EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Urbanização da Lagoa da Maraponga.	PMF – GEC – SEMA/ Juntos por Fortaleza	Sem informação.
Requalificação da Lagoa do Mondubim.	Mais Ação	Sem informação.
Pavimentação e Saneamento das ruas do Mondubim. - Área de Pavimentação - 163.581,1m ² - Extensão de Galerias de Drenagem - 1.971m. - Extensão de Rede de Esgoto – 21.491,46m.	Proinfra/Seinf	Em Obra. 30/08/2019 - Início obra das Ruas do Mondubim 30/02/2022 - Previsão de término da obra.
Obras de microdrenagem e recuperação asfáltica dentro do projeto do Binário.	SCSP	Sem informação.
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros.	SCSP	Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos de Fortaleza.
Construção Ecoponto Maraponga.	SCSP	Em licitação.

5

EIXO CINCO - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Os Fóruns serão institucionalizados junto à nova territorialização administrativa de Fortaleza, fazendo parte da estrutura das Secretarias Regionais.	Iplanfor	Aprovado.

6

EIXO SEIS - GOVERNANÇA MUNICIPAL

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Os Fóruns territoriais farão parte da estrutura das Secretarias Regionais na nova territorialização.	Iplanfor	Aprovado.
